Agip

AGEO-SECA

Profilo del pozzo :

MONTEROSSO 1

AGIP ARCHIVIO POZZI AGEO

E/PROF

Permesso RAGUSA — Cod. pozzo 03131

Disegno N°	Aggiornato al :	Allegato a :			Allegato N°
	1/9/1986				
Scala : 1/1000	Data : 26/09/86	Compilatore :	Operatore : G.CIMINO	Revisore : G.CIMINO	

Titolare : GULF ITALIA COMPANY

Operatore : GULF ITALIA COMPANY 100.000%

Paese : ITALIA	Reg. : SICILIA	Zona : 5
Carta IGM	Foglio 273	Tav. II N.O. Scala : 1/25000
Comune : MONTEROSSO ALMO (RG)		
Coord. Geog. Long. E 2° 17' 45''		Lat. N 37° 05' 58''
Coord. Piane Est		Nord
Fondo pozzo Long.		Lat.

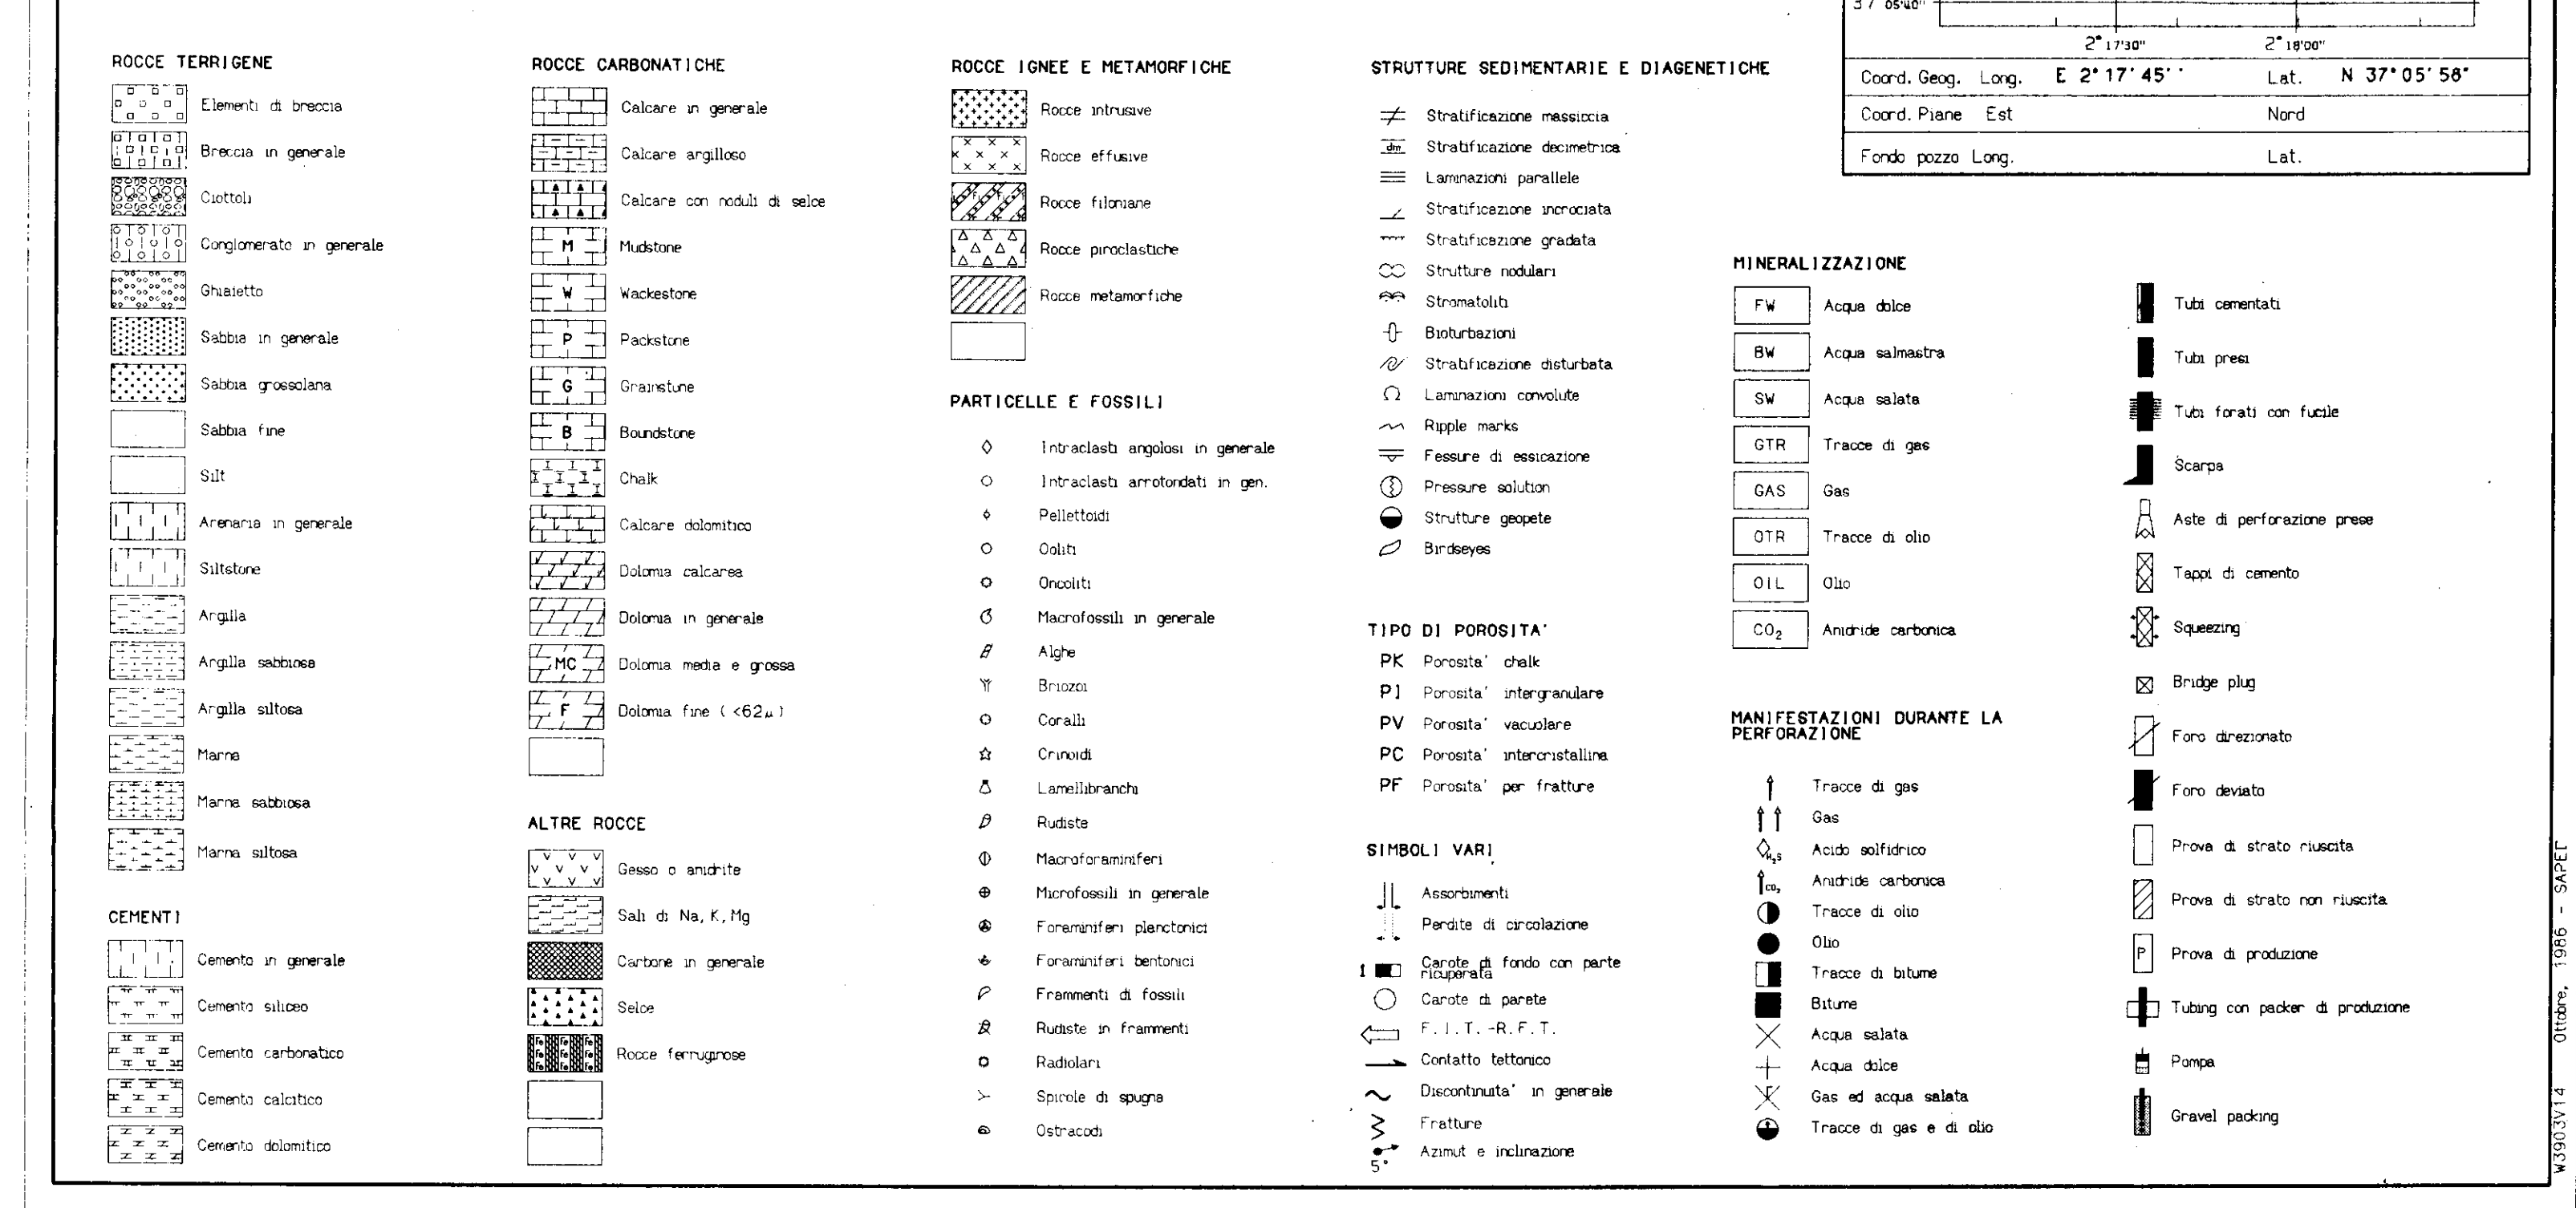

Impianto NATIONAL T 20	Inizio perforazione 04-02-58	Inizio produzione - -	Esito del pozzo STERILE
Contrattista GULF ITALIA COMPANY	Fine perforazione 07-03-58	Int. in produzione	Status TAPPATO E ABBANDONATO
Profondita' totale m. 1218.0	Impianto rilasciato il - -		

Quota s.l.m.: Tavola rotary 454.80; Prima flangia 450.80; Piano campagna 452.00

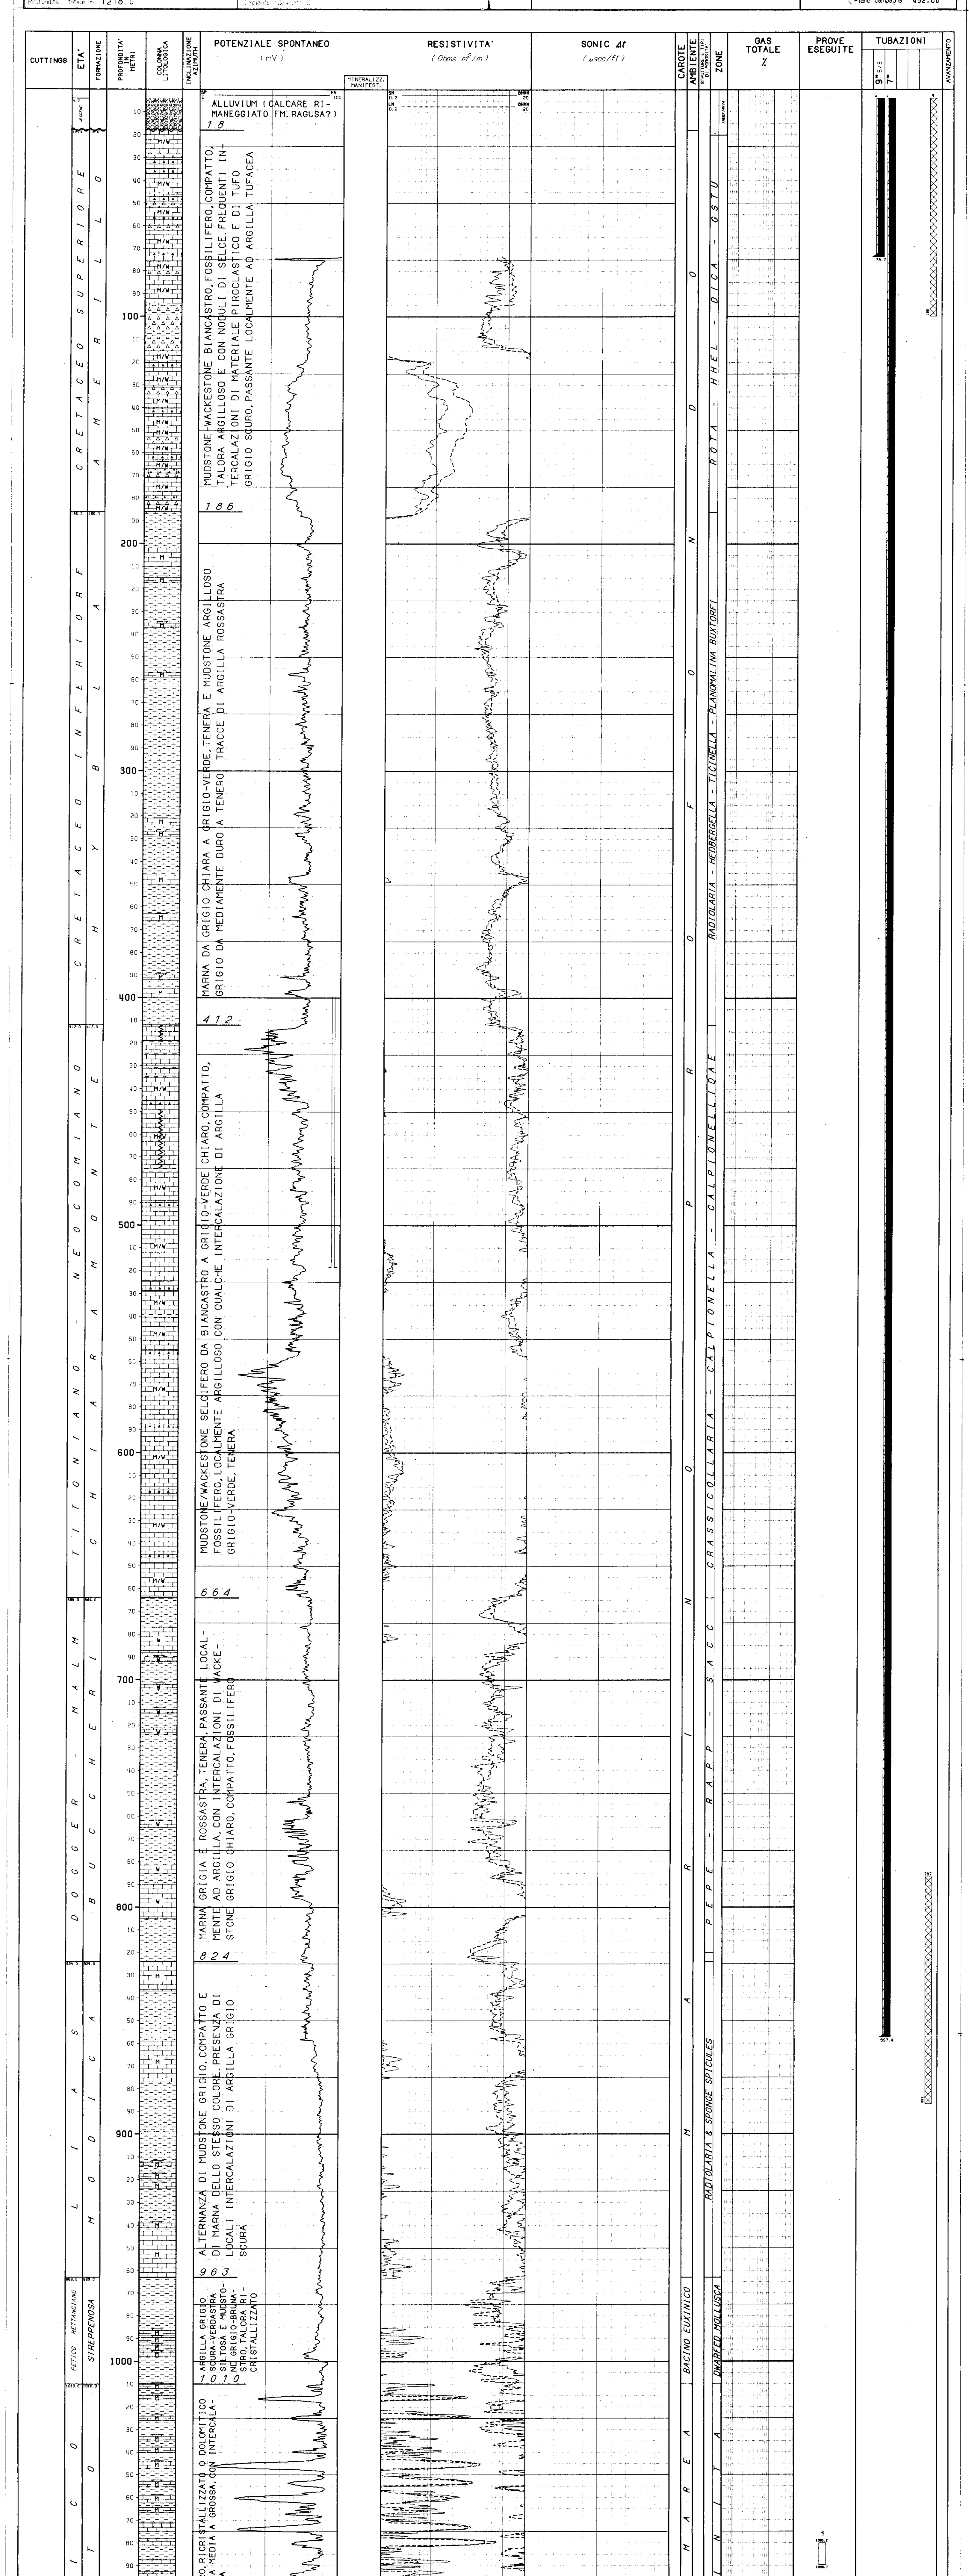

NUMERO IMPIANTO: 1 NOME IMPIANTO: NATIONAL T 20

NOTA: Tutte le profondita' sono in metri e riferite al P.T.R, le pressioni sono in Kg/cm2, le temperature in gradi C, i tempi in ore.minuti.

TUBAZIONI

(T=Tipo di rivestimento/C-Casing/L-Liner/F-Liner finestrato/R-Liner reintegrato)

Fr.	Nr.	T	Top	Bottom		Diametro
1	1	C	4.Ø	73.8	Scarpa	Ø9-Ø5/Ø8
1	2	C	4.Ø	857.4	Scarpa	Ø7-ØØ/ØØ

CEMENTAZIONE / CEMENTO / ADDITIVI (tubazione 1)

Nr.	Std	D.V.	Ris.teor.	Classe	q.	Tipo	q.	Note
1	1		4.Ø		4Ø.Ø			DATI SUL CEMENTO NON DISPONIBILI

CEMENTAZIONE / CEMENTO / ADDITIVI (tubazione 2)

Nr.	Std	D.V.	Ris.teor.	Classe	q.	Tipo	q.	Note
1	1		4.Ø		45.Ø			DATI SUL CEMENTO NON DISPONIBILI

MISURE DI VERTICALITA'

(Gradi Sessagesimali)

Fr.	Prof.M.	Prof.V.	Dev.	Dir.Geog	Fr.	Prof.M.	Prof.V.	Dev.	Dir.Geog	Fr.	Prof.M.	Prof.V.	Dev.	Dir.Geog
1	41.1		Ø.15		1	329.2		1.3Ø		1	761.4		2.ØØ	
1	123.4		1.15		1	571.5		1.15		1	771.1		Ø.3Ø	
1	158.5		1.3Ø		1	636.4		1.15		1	846.7		Ø.3Ø	

CUTTINGS

Fr.	Top	Bottom	Camp.	Tipo	Sr.
1	4.Ø	1218.Ø	Ø.Ø		

CAROTE DI FONDO

CAROTA NR. 1
FORO 1 DA 1154.3 A 1158.5 SCOPO MINERARIO REC. m Ø.3= 7.Ø%

Manifestazioni: BITUME SECCO SULLE SUPERFICI DI FRATTURA.
Pendenza : N.R. Ultima verticalita' del foro Ø°3Ø' a 846.7 metri
Eta' e/o Formazione:RETICO (NOTO)
Descrizione Litologica: DOLOMIA DA BIANCASTRA A GRIGIO CHIARA, CRISTALLINA, DURA, COMPATTA, CON QUALCHE CAVITA' IN SUPERFICIE. LA CAROTA E' INTENSAMENTE FRATTURATA E RIDOTTA A PICCOLI FRAMMENTI.

CAROTE DI PARETE

nessuna

FANGO DI PERFORAZIONE

(Densita" espressa in g/l; Cloruri in g/l NaCl)

Fr.	Top	Bottom	Tipo	Densita'	Cloruri	Olio%	Fr.	Top	Bottom	Tipo	Densita'	Cloruri	Olio%	Note
1	4.Ø	856.Ø	RS	134Ø			1	856.Ø	1218.Ø	AR	117Ø			DATI RIFERITI A PROFONDITA' REGISTRAZIONE LOG ELETTRICI

ASSORBIMENTI

(T=Tipo/A-Assorbimento/P-Perdita)

Fr.	Top	Bottom	T	mc	Nota	Fr.	Top	Bottom	T	mc	Nota
1	399.3	446.5	A	3		1	114Ø.6	1154.3	A	3	
1	446.5	518.5	A	6		1	1158.5	1164.9	P	23	

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE MINERARIO

nessuna

OPERAZIONI DI WELL LOGGING

(D = Discesa/R = Run)

Fr.	Nr	D	Codice	R	Top	Bottom	Data	Contrattista
1	1	1	ES	1	73.8	855.9	19/Ø2/58	SCHLUMBERGER
1	1	1	SP	1	73.8	854.Ø	"	"
1	1	2	CDM	1	73.8	856.2	"	"
1	2	1	ES	2	857.4	1154.3	Ø3/Ø3/58	SCHLUMBERGER
1	2	1	SP	2	857.4	1154.3	"	"
1	2	2	CDM	2	857.4	1154.Ø	"	"
1	3	1	ES	3	857.4	1218.3	Ø7/Ø3/58	SCHLUMBERGER
1	3	1	SP	3	857.4	1218.3	"	"

RISULTATI LOGS DI PRODUZIONE

nessuno

TEMPERATURE DAI LOGS

Fr.	Nr	D	prof.M.	Prof.V.	T.Misur.	t	Dt	T.Calc.
1	2		1154.3		6Ø.Ø			

TAPPI DI CEMENTO

Fr.	Nr.	Top	Bottom	Scopo	Cl.Cem.	q.	Additivi	q.	Fresato per...	Fino a	Note
1	1	787.Ø	887.Ø	CHIUSURA MINERARIA		18.Ø					DATI SUL CEMENTO NON DISPONIBILI
1	2	4.Ø	1ØØ.Ø	CHIUSURA MINERARIA		18.Ø					DATI SUL CEMENTO NON DISPONIBILI

SQUEEZINGS

nessuno

BRIDGE PLUGS

nessuno

PROVE DI STRATO

(P=Provenienza fluido/B-Batteria/S-Sotto Paker/F-Formazione/P-Pozzo)
(S.op.=Sotto operazione/CIRC-Circolazione/CLUP-Spurgo/DISP-Spiazzamento/END-Stato finale del pozzo/FLOW-Erogazione/LIFT-Lifting/POUT-Pompaggio/RECO-Recupero dalle aste SHIN-Chiusura/STIM-Stimolazione/STRT-Stato iniziale del pozzo/SWAB-Pistonaggio)

NR. 1
FORO 1 DA 1Ø8Ø.2 A 1Ø89.7 PROVA IN FORMAZIONE

Tester HYDROSPRING — Valvola di circolazione
Packer HALLIBURTON — Diam. — Fissato a 1Ø8Ø.2
Carico — Delta P. — Duse F. — Fango S.Packer litri
Batteria formata 2 7/8 — Vol. Tot. litri
Cuscino in Batt. NESSUNO — Vol. Tot. litri

S.op.n	Durata	Dusi di testa	P.Testa	P.Fondo	R	Fluido	P	Vol.mc	Portata	Dens	API	Clor.	pH
STRT 1	Ø.ØØ	ØØ-Ø1/Ø4		123.7									
FLOW 1	Ø.Ø1	ØØ-Ø1/Ø4		2.1									
FLOW 1	1.Ø4	ØØ-Ø1/Ø4		62.2									
------	1.Ø5	-Totale-											
SHIN 1	Ø.3Ø	ØØ-Ø1/Ø4		64.Ø									
END 1	Ø.Ø1	ØØ-Ø1/Ø4		123.7									
RECO 1	Ø.ØØ					SW	F	1.36				25.5	

RISULTATI DELLA PROVA

ACQUA SALATA CON TRACCE DI GAS.

NR. 2
FORO 1 DA 1151.5 A 1158.5 PROVA IN FORMAZIONE

Tester HYDROSPRING — Valvola di circolazione
Packer HALLIBURTON — Diam. — Fissato a 1151.5
Carico — Delta P. — Duse F. — Fango S.Packer litri
Batteria formata 2 7/8 — Vol. Tot. litri
Cuscino in Batt. NESSUNO — Vol. Tot. litri

S.op.n	Durata	Dusi di testa	P.Testa	P.Fondo	R	Fluido	P	Vol.mc	Portata	Dens	API	Clor.	pH
STRT 1	Ø.ØØ	ØØ-Ø1/Ø4		138.5									
FLOW 1	Ø.Ø1	ØØ-Ø1/Ø4		71.Ø									
FLOW 1	Ø.16	ØØ-Ø1/Ø4		75.2									
------	Ø.17	-Totale-											
SHIN 1	Ø.Ø7	ØØ-Ø1/Ø4		83.Ø									
END 1	Ø.Ø1			138.5									
RECO	Ø.ØØ					SW	F	1.71				23.8	

RISULTATI DELLA PROVA

ACQUA SALATA CON TRACCE DI ANIDRIDE CARBONICA E GRUMI DI BITUME.

PROVE DI PRODUZIONE

nessuna

VACUUM TESTS

nessuno

WIRELINE FORMATION TESTS

nessuno

STIMOLAZIONI

(F.op. = fase operativa/PREP-preparazione/WASH-pulizia foro/DISP-spiazzamento/PREF-preflush/INJ-iniezione/AFTF-afterflush/SHUT-chiusura/WAIT-attesa)

nessuna

ANALISI

nessuna

NOTE TECNICHE

nessuna

RISULTATI MINERARI

IL POZZO E'RISULTATO STERILE

RISULTATI GEOLOGICI

STRATIGRAFIA AGGIORNATA ALL'APRILE 86 DA PETR(A.FRIXA) E STIG(M.CECCHI))
