FINA ITALIANA S.p.A.

RICERCHE IDROCARBURI

PROFILO FINALE

SAVINI 2 Dir.

PERMESSO:	ROSETO DEGLI ABRUZZI
EVOLUZIONE:	FINA 33% SOPR 50% LASMO 17%
AREA:	ABRUZZI
PROVINCIA:	TERAMO
IMPIANTO:	NATIONAL 1220 M PERGERINE
CONTRATTO:	
INIZIO PERFORAZIONE:	21/11/1967
FINE PERFORAZIONE:	25/11/1967
RILASCIO IMPIANTO:	3/12/1967
QUOTA T.R.:	151 m
QUOTA P.C.:	143,5 m
PROFONDITÀ FINALE:	1605 m (Tv =1513,2m)
ESITO MINERARIO:	STERILE
INTERVALLI MINERALIZZATI:	
INTERVALLI IN PRODUZIONE:	
INIZIO PRODUZIONE:	

GEOLOGO DI CANTIERE:	G. BERTOZZI
COMPILATORE:	G. BERTOZZI
MICROPALEONTOLOGO:	CRESCENTI-PANDERI C.
DISEGNATORE:	M. GABELLI

Scala: 1:1000	Tv = Tempo Verticale Vero "Pozzo SAVINI 2Dir."	Dis. GL-128.13	Data: Febbraio 1988	Foglio: 3

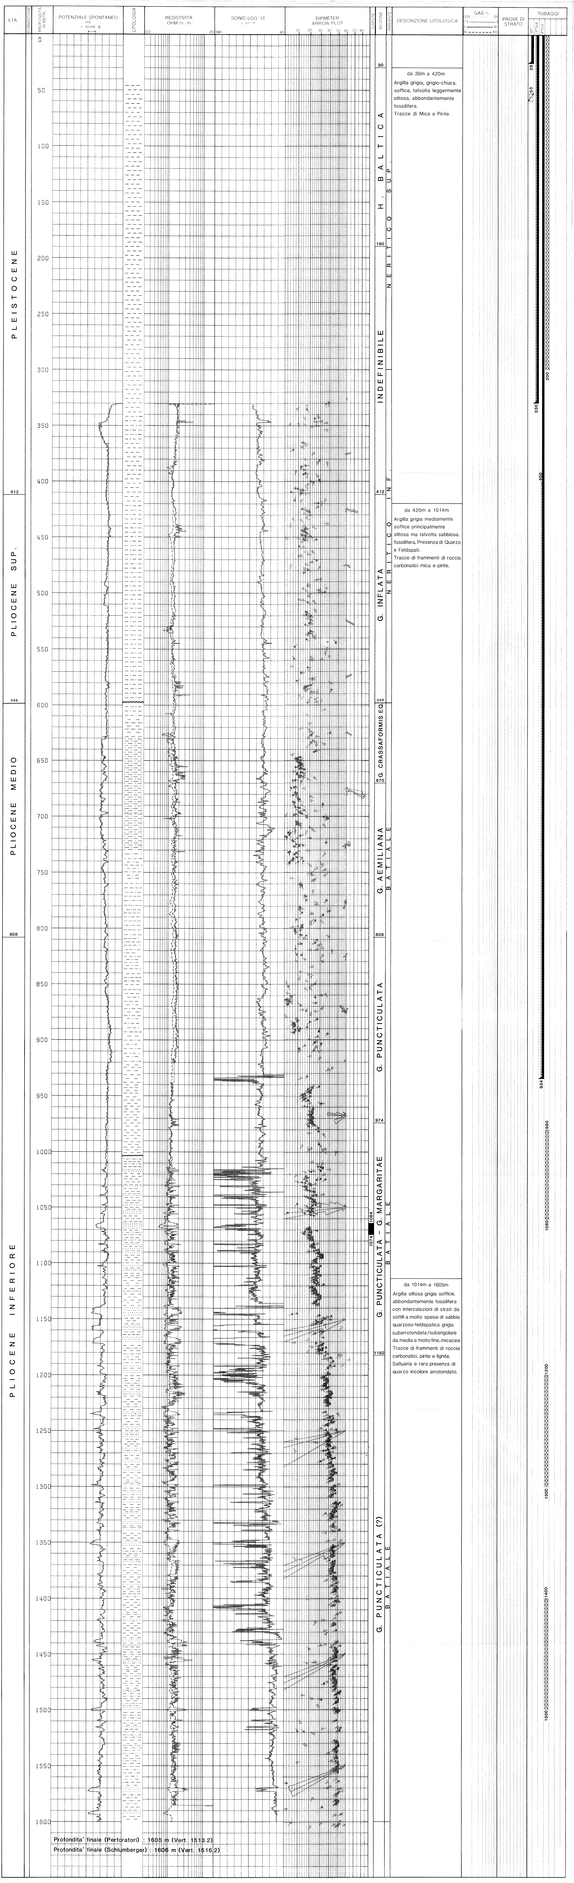

T I R A N T I

20"	da 0	a 29 m	battuto a vibro
13" 3/8	" 0	" 130 m	cementato a piena con 75 t di malta classe "G" (1,8 SG)
9" 5/8	" 0	" 934 m	cementato con 37 t di malta classe "G" (1,8 SG) top del cemento a circa 400 m

C O N T R O L L I D I C E M E N T A Z I O N E

Vedasi

C A R O T A G G I

da 30	a	480 m	ogni 6 m
" 480	"	934 m	ogni 4 m
" 934	"	1605 m	ogni 2 m
" 1608	"	1605 m	ogni 2 m

F A N G O D I P E R F O R A Z I O N E

Fango tipo AB da 30 a 333 m D = 1080

Fango tipo LS " 333 " 934 m D = 1500
" 934 " 1605 m D = 1600/1080 m

C A R O T A G G I D I F O N D O

N. 1 carota a scopo petrolifero minerario:

da 1064 a 1074 m - recupero 9.80 m (98%)

C A R O T A G G I D I P A R E T E

Vedasi

M A N I F E S T A Z I O N I

Le manifestazioni principali minerate dei gas detector Drexser si sono avute a:

1014 m = 12%	1558 m = 12%
1018 m = 0.1%	1560 m = 16%
1138 m = 10%	1569 m = 40%
1158 m = 24%	1584 m = 36%

R I N V E N I M E N T I

In 34 durante controlle fatte per RFT
1 durante controlle fatte per VSP

N O T E (Manovrecorso delle drilling)

Società : TEGEDO

da 333 a 1605 m

N I C H I E S T A D I D E V I A Z I O N E (MWD)

M.DPTH Meters	INCLINATION Degrees	AZIMUTH Degrees	T.V.D. metres
0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	0.00	0.00	33.00
82.00	0.25	84.50	82.00
126.00	10.25	82.00	125.57
154.00	14.75	77.00	152.92
174.00	16.75	77.00	172.21
194.00	18.75	77.00	190.97
221.00	21.50	77.75	216.63
247.00	28.50	80.00	238.42
305.00	34.50	81.00	286.61
334.00	37.75	81.50	306.33
363.00	40.50	81.50	325.11
394.00	41.00	82.50	345.41
399.00	41.25	77.50	363.41
420.00	38.00	72.50	381.00
441.00	38.40	72.10	395.73
462.00	39.00	72.50	410.41
478.00	41.90	73.50	421.57
496.00	40.30	72.10	437.34
515.00	37.90	72.70	451.94
555.00	35.40	72.10	484.35
592.00	32.20	72.80	513.40
630.00	31.00	72.80	543.27
668.00	29.40	71.70	572.79
698.00	27.50	72.80	595.00
728.00	25.50	72.80	618.29
758.00	23.70	72.80	640.47
788.00	22.00	74.10	662.11
817.00	20.20	73.50	684.41
847.00	18.60	74.20	706.79
877.00	17.70	73.50	729.34
907.00	16.80	74.20	751.94
937.00	16.00	74.90	774.63
967.00	15.30	73.80	797.37
997.00	14.50	72.80	820.16
1027.00	13.80	73.50	843.00
1057.00	13.00	73.50	865.91
1087.00	12.20	73.50	888.87
1117.00	11.50	72.80	911.89
1147.00	10.80	72.80	934.96
1177.00	10.20	72.80	958.08
1207.00	9.60	72.80	981.25
1237.00	9.00	72.80	1004.47
1267.00	8.50	72.80	1027.73
1297.00	8.00	72.80	1051.04
1327.00	7.50	72.80	1074.39
1357.00	7.00	72.80	1097.79
1387.00	6.50	72.80	1121.23
1417.00	6.00	72.80	1144.72
1447.00	5.50	72.80	1168.25
1477.00	5.00	72.80	1191.83
1507.00	4.50	72.80	1215.45
1537.00	4.00	72.80	1239.12
1567.00	3.50	72.80	1262.83
1597.00	3.00	72.80	1286.59
1608.00	2.90	72.80	1296.15

O P E R A Z I O N I E L E T T R I C H E (Schlumberger)

IN POZZO DISPOSTO

DATA	LOGS	POZZO T	BOB	INTERVALLO in m
11/11/67	IES-GLS-GR-SP	12" 1/4	1	150 - 934
				150 - 934
21/11/67	DIPT-GR	8" 1/2	2	934 - 935
21/11/67	IES-MSFL-GLS-GR-SP	8" 1/2	2	934 - 1602
22/11/67	HDT-TDL-BATT-GR	8" 1/2	2	934 - 1605
26/11/67	MSD	8" 1/2	2	30 presenza
				35 dry tests
30/11/67	DAT-VSP		1	150 - 1605
				(no problems for problems)

IN POZZO TUBATO

Nessuna registrazione.

ELABORAZIONI SPECIALI

DATA	LOGS	POZZO T	BOB	INTERVALLO in m
11/11/67	CYBERDIP	12" 1/4	1	150 - 935
21/11/67	CYBERDIP	8" 1/2	2	934 - 1605
26/11/67	MSD	8" 1/2	2	934 - 1605
26/11/67	MSD	8" 1/2	2	150 - 935
1/12/67	MSD	8" 1/2		935 - 1605
21/12/67	TVD PLATBACK			150 - 1605

T E M P E R A T U R A D I F O N D O

Temperature statiche calcolate (da loga elettrici) : 55 C

T A P P I D I C E M E N T O (per chiusura minerale)

1 da 1500 a 1480 m	cementato con 4.8 t di malta classe "G" (1.8 SG)	
2 " 1300 " 1200 m	cementato con 4.1 t di malta classe "G" (1.8 SG)	
3 " 1060 " 900 m	cementato con 11 t di malta classe "G" (1.8 SG)	
4 " 300 " 0 m	cementato con 25 t di malta classe "G" (1.8 SG)	
