Agip S.p.A.
GESO-SNOR

E/PROF
All. R/RFIN
AGIP ARCHIVIO POZZI AGEO

Profilo del pozzo:

B.R15.AS/2 (EDGAR 2) OFF-SHORE

Joint venture: AGIP 51% - SHELL 49%

Permesso: B.R15.AS

Disegno N°:	Aggiornato al:	Allegato a: RELAZIONE FINALE B.R15.AS/2 (EDGAR 2)		Allegato N°: 7
Scala: 1:1000	Data: MAGGIO 1981	Compilatore: V. COSTA	Disegnatore: O.ORZENINI - P.LOMBARDI	

ITALIA Mare ADRIATICO (Zona B)
Carta: — F°: — Tav: — Scala 1:25000

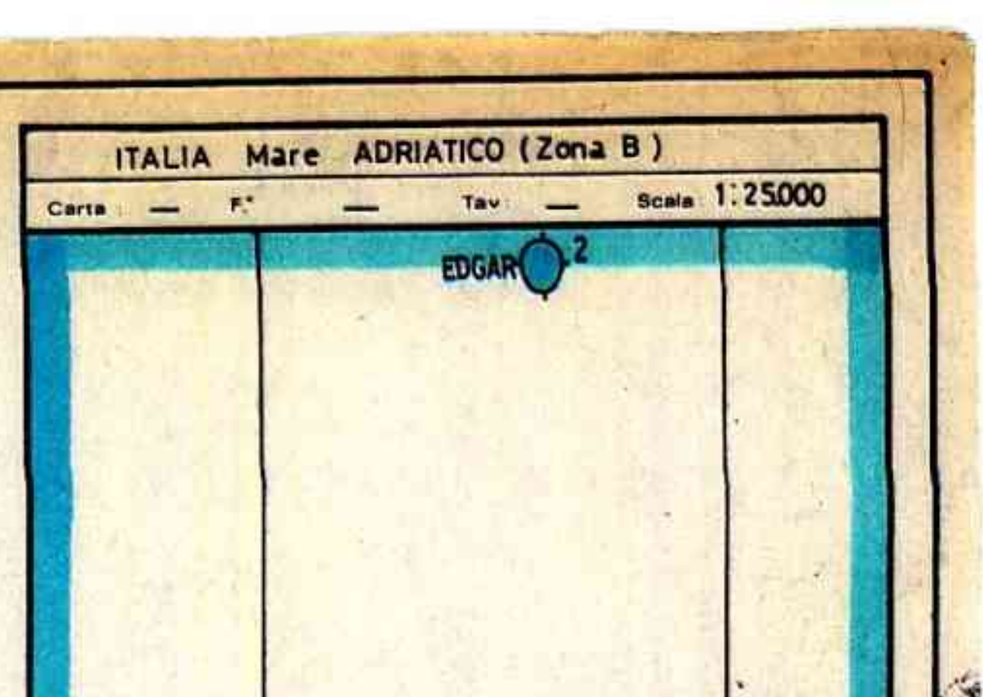

Coord. geog. Long. 14°52'36",60 E Lat 42°56'41",29 N
Coord. piane E 2.509.951,331 m N 4.754.778,159 m
Fondo pozzo Long ...... Lat ......

ROCCE TERRIGENE
Elementi di breccia; Ciottoli; Sabbia grossolana; Sabbia fine; Sabbia quarzosa; Sabbia sublitica; Sabbia litica; Sabbia subfeldspatica; Sabbia feldspatica; Silt; Argilla; Marna

CEMENTI
Cemento in generale; Cemento siliceo; Cemento carbonatico; Cemento calcitico; Cemento dolomitico; Cemento solfatico; Cemento ferruginoso; Cemento sideritico

ROCCE CARBONATICHE
Calcare in generale; Mudstone; Wackestone; Packstone; Grainstone; Boundstone; Chalk; Calcare dolomitico; Dolomia calcarea; Dolomia in generale; Dolomia media e grossa (> 62 μ); Dolomia fine (< 62 μ)

ALTRE ROCCE
Gesso o anidrite; Sali di Na, K, Mg.; Carbone in generale; Selce; Rocce ferruginose

ROCCE IGNEE E METAMORFICHE
Rocce intrusive; Rocce effusive; Rocce filoniane; Rocce piroclastiche; Rocce metamorfiche

PARTICELLE E FOSSILI
Intraclasti angolosi in generale; Intraclasti arrotondati in generale; Pellettoidi; Ooliti; Oncoliti; Macrofossili in generale; Alghe; Briozoi; Coralli; Crinoidi; Lamellibranchi; Rudiste; Macroforaminiferi; Microfossili in generale; Foraminiferi planctonici; Foraminiferi bentonici; Frammenti di fossili; Rudiste in frammenti; Radiolari; Spicole di Spugna; Ostracodi

STRUTTURE SEDIMENTARIE E DIAGENETICHE
Stratificazione massiccia; Stratificazione decimetrica; Laminazioni parallele; Stratificazione incrociata; Stratificazione gradata; Strutture nodulari; Stromatoliti; Bioturbazioni; Stratificazione disturbata; Laminazioni convolute; Ripple marks; Fessure di essiccazione; Pressure solution; Strutture geopete; Birdseyes

TIPI DI POROSITA'
PK Porosità chalk
PI Porosità intergranulare
PV Porosità vacuolare
PC Porosità intercristallina
PF Porosità per fratture

SIMBOLI VARI
Assorbimenti; Perdite di circolazione; Carote di fondo con parte ricuperata; Carote di parete; F.I.T. - R.F.T.; Contatto tettonico; Discontinuità in generale; Fratture; Azimut e inclinazione

MINERALIZZAZIONE
Acqua dolce; Acqua salmastra; Acqua salata; Tracce di gas; Gas; Anidride carbonica; Tracce di olio; Olio

MANIFESTAZIONI DURANTE LA PERFORAZIONE
Tracce di gas; Gas; Acido solfidrico; Anidride carbonica; Tracce di olio; Olio; Bitume; Acqua salata; Acqua dolce; Gas ed acqua salata; Tracce di gas e di olio

Tubi cementati; Tubi forati con fucile; Tubi "presi"; Aste di perforazione "prese"; Tappi di cemento; Squeezing; Bridge plug; Foro direzionato; Foro deviato; Prova di strato riuscita; Prova di strato non riuscita; Prova di produzione; Tubing con packer di produzione; Pompa

Impianto NATIONAL 1625 D.E. (Saipem 2) — Inizio perforazione 13 - 1 - 1980 — Intervallo in produzione — — Esito del pozzo STERILE
Contrattista SAIPEM — Fine perforazione 28 - 2 - 1980 — Quota s.l.m: Tavola rotary m 13,00; Prima flangia m —; Piano campagna m — — Fondo mare - m 178,00; T.R.- P.C. m —
Profondità totale m 2100 — Impianto rilasciato il 9 - 3 - 1980 — Inizio produzione — — Status ABBANDONATO

CUTTINGS | ETA' | FORMAZIONE | PROFONDITA' IN METRI | COLONNA LITOLOGICA | AZIMUT INCLINAZIONE | POTENZIALE SPONTANEO (mV) o GAMMA RAY (API Units) | Mineralizz. Manifestaz. | RESISTIVITA' ohms m²/m | CAROTE | AMBIENTE | Strutture e tipi di porosità | PALEONTOLOGIA: FOSSILI, ZONE | PROVE ESEGUITE | TUBAZIONI: 30", 13" 3/8, 9" 5/8, 7" | OSSERVAZIONI | Avanzamento

Fondo pozzo perforatori m 2100
Fondo pozzo Schlumberger m 2101

OSSERVAZIONI

Tutte le profondità sono riferite al piano tavola rotary.

TUBAZIONI

Ø 30" a m 282
Cementata fino a fondo mare con q.li 720

Ø 13"3/8 a m 447
Cementata fino a fondo mare con q.li 570

Ø 9"5/8 a m 888
Cementata fino a m 365 con q.li 300

Ø 7" a m 2050
Cementata in due stadi; Collare DV a m 1708, 1^ stadio cementato fino al DV con q.li 70. 2^ stadio cementato fino a m 693 con q.li 260.

Recuperata testa pozzo con carica esplosiva SSOS fino a m 199.

TERMOMETRIE E CBL

Per la Ø 9"5/8: eseguito CBL; top cemento a m 365. Cementazione buona.

Per la Ø 7": eseguito CBL; top cemento 1^ stadio al DV. Top 2^ stadio cemento a m 693. Cementazione buona.

PROVE DI VERTICALITA' (totco)

A m 455 = 0°45'
" " 846 = 0°15'
" " 1156 = 1°00'
" " 1285 = 0°30'
" " 1482 = 0°15'
" " 1559 = 1°15'
" " 1633 = 2°15'
" " 1701 = 3°00'
" " 2038 = 3°45'
" " 2100 = 3°30'

CUTTINGS

Da m 290 a m 660 prelevati ogni 15 metri
Da m 660 a m 854 ogni 5 metri
Da m 854 a F.P.m 2100 ogni 3 metri.

CAROTE DI FONDO

Prelevate n° 3 tutte con recupero.

CAROTE DI PARETE

Prelevate n° 60 di cui n° 46 recuperate, n° 8 rimaste in pozzo e n° 6 non partite.

FANGO DI PERFORAZIONE

Tipo AR:
m 191 - 455 D = 1130
Tipo LS:
m 455 - 703 D = 1060
" 703 - 946 D = 1100
" 946 - 1295 D = 1150
Tipo AS:
" 1295 - 1566 D = 1120
" 1566 - 1707 D = 1140
" 1707 - 2089 D = 1120
" 2089 - 2100 D = 1130

ASSORBIMENTI

Durante la perforazione:
Da m 766-896 = mc. 93
A m 1919 = perdita totale di circolazione
Da m 1919-1972 = mc.219
Durante la cementazione del Csg. Ø 9"5/8=mc. 6
Allo svincolo del packer (DST n° 2) = mc. 39
Durante il fresaggio del BP di m 880 = mc. 3.

MANIFESTAZIONI

Nessuna.

SCHLUMBERGER

1a operazione:
ISF/SLS da m 448 a m 895
FDC/CNL-GR m 448 a m 895
HDT da m 448 a m 895
CST
2a operazione:
ISF/SLS m 888 - 2101
FDC/CNL-GR m 888 - 2101
DLL/MSFL-GR m 888-2099
CBL/VDL da m 888-2101
HDT+FIL da m 888-2100
CBL da m 178-888
WST

3a operazione
CBL da m 190 a m 2024,50
CNL/CCL da m 1650-1950

TEMPERATURE DAI LOGS ELETTRICI

A m 896 = 32°C. Statica (calcolata) = 33°C
A m 2100 = 51°C. Statica (calcolata) = 52°C
A m 2100 = 50°C. Statica (calcolata) = 51°C.

PERFORAZIONE DELLA COLONNA Ø 7":

Da m 1927 a m 1942 con n° 195 c.c. Hyper-jet (fucile CG-EL Ø 4").

TAPPI DI CEMENTO

Da m 2050 a m 2025 Collare di cementazione
Da m 1690 a m 1640 con q.li 14
Da m 1600 a m 1400 con q.li 50
Da m 500 a m 290 con q.li 65
+ Cemento rimasto in colonna dopo lo squeezing.

BRIDGE-PLUGS

1^) Fissato a m 1690 Tipo Cement Retainer Ø 7"

SQUEEZINGS

Eseguito attraverso spari di m 1927-1942 con BP fissato a m 1690 con q.li 137 per chiusura intervallo provato.

PROVE DI STRATO IN FORMAZIONE

1a) 6/12.2.1980
m 888 - 946
Eseguita attraverso la scarpa del Csg. Ø 9"5/8 con BP Baker "K" fissato a m 880
Tubing Ø 3"½ VAM per l'acidificazione + Aste Ø 5" per i 18 prelievi
Dusi: nessuna
Durata: in 6 giorni eseguita acidificazione e 18 prelievi per un totale di erogazione di 23 h. 52'.
Risultati: (dopo l'acidificazione) acqua salata probabile con tracce minime di H2S più o meno contaminata da acido spento
Pressioni: nessuna
Fluidi recuperati: mc. 130,8 su 115,3 immessi.

31-1-1980 m 950

PROVE DI STRATO IN COLONNA

2a) 5/7.3.1980
m 1927 - 1942
Packer Positest J. Ø 7" fissato a m 1915
Aste Ø 3"½+DC 4"3/4 vuote
Dusi: di testa Ø 1/4" di fondo nessuna
Durata: 7 h.59' (di cui 2 h.58' di erogazione + 5 h.1' di chiusura)
Risultati: acqua salata (NaCl=35,67 g/l.) con tracce minime di gas
Pressioni: (Kg/cmq.)
di testa: 0,28
di fondo (BT inf.) erogazione iniziale 46,6; finale 194,5; chiusura 197,1 (stabilizzata).
Fluidi recuperati: mc. 5,4 di acqua salata.

STIMOLAZIONI

Con packer Baker "FH" fissato nel Csg. Ø 9"5/8 eseguita acidificazione nell'intervallo sottoscarpa (m 888-946) con 55,2 di HCl al 28%.

PROVE DI PRODUZIONE

Nessuna

PROVE DI ASSORBIMENTO

Da m 1927 a m 1942 (intervallo sparato)
BP Baker "K" a m 1690;
Assorbe 160 1/1' con 70 Kg/cmq di pressione.

A N A L I S I

Campione di acqua prelevato il 7.3.1980 durante il DST n° 2 (m 1927-1942) nel Sampler:
Colore: giallastra
Odore: idrocarburi
Fluorescenza: azzurra
Densità a 15°C: 1,0287
pH: 6,88
Resistività a 20°C ohm m : 0,19
Salinità come NaCl: g/l. 35,77

CAROTE DI FONDO (descrizione)

1^) m 1482 - 1491
Recupero: m 2,5 = 28%
Mudstone grigio e biancastro talora friabile, fossilifero, con presenza di Stiloliti.
Pendenze: suborizzontali
Manif.: nessuna
Età: Neocomiano
F.ne: Maiolica

2^) m 1701 - 1706
Recupero: 5 = 100%
Dolomia nocciola a grana medio-fine con fitte fratture completamente ricementate.
Pendenze: N.R.
Manif.: nessuna
Età: Dogger
F.ne: Calcari ad aptici

3^) m 1930 - 1934
Recupero: m 2 = 50%
Wackestone grigi, fossiliferi più o meno dolomitizzati di aspetto brecciato
Pendenze: N.R.
Manif.: odore di H2S
Età: Lias medio
F.ne: Corniola

CAROTE DI PARETE (descrizione)

1) m 678,0 Gesso ? con fango
2) m 675,5 Calcare argilloso, friabile
3) m 673,0 Calcare con frammenti argillosi
4) m 670,5 Calcare friabile argilloso, pasante a calcare
5) m 668,0 Calcare friabile argilloso
6) m 665,5 Piccoli frammenti calcarei con argilla grigio-verde
7) m 663,0 Grossi frammenti come sopra
8) m 660,5 Argilla grigio-verde plastica
9) m 658,0 come sopra
10) m 655,5 Fango con frammenti ?
11) m 653,0 Fango
12) m 650,5 Argilla grigio-verde chiara
13) m 648,0 Fustella in pozzo
14) m 645,5 Argilla verdastra
15) m 643,0 Fustella in pozzo
16) m 640,5 Argilla verdastra
17) m 638,0 come sopra
18) m 635,5 Argilla grigio-verde
19) m 633,0 Frammenti di calcare?
20) m 630,5 Argilla
21) m 628,0 c.s.
22) m 625,5 Argilla gr. verde con framm. calc.?
23) m 623,0 Non partita
24) m 620,5 Argilla gr-v.
25) m 618,0 Fus. in pozzo
26) m 615,5 Argilla gr-v.
27) m 613,0 c.s.
28) m 610,5 c.s.
29) m 608,0 c.s.
30) m 605,5 c.s.
31) m 603,0 c.s.
32) m 600,5 c.s. con rari ciottoli
33) m 598,0 Argilla gr-v.
34) m 595,5 Fango ?
35) m 593,0 Fus. in pozzo
36) m 590,5 c.s.
37) m 588,0 Argilla gr-v.
38) m 585,5 c.s.
39) m 583,0 c.s.
40) m 580,5 c.s. con rari ciottoli
41) m 578,0 c.s.
42) m 572,0 Argilla gr-v. molto plastica (fango?)
43) m 566,0 c.s. leggermente plastica
44) m 560,0 Fus. in pozzo
45) m 554,0 Argilla leggerm. plastica gr-v.
46) m 546,0 Non partita
47) m 542,0 Argolla gr-v. legg. plastica
48) m 536,0 come sopra
49) m 530,0 Non partita
50) m 524,0 Argilla gr-v.
51) m 518,0 Fus. in pozzo
52) m 512,0 Non partita
53) m 506,0 Argilla gr-v.
54) m 500,0 c.s.
55) m 494,0 Non partita
56) m 488,0 c.s. legg. plastica
57) m 482,0 Fus. in pozzo
58) m 476,0 Non partita
59) m 470,0 Argilla grigio-verde plastica
60) m 464,0 Argilla gr-v plastica con chiazze nerastre.

28-2-1980 m 2100
